№	Наименование	Мярка	Количество	Брой работници	Брой работни дни
	А: Демонтажни работи				
1	Опаковане с найлон и изнасяне на имущество	бр.	1	2,00	2,00
2	Демонтаж на линолеум/паркет и замазки	м2	324	3,00	4,00
3	Демонтаж на балатум в гардеробни и кабинети	м2	81,94	4,00	3,00
4	Демонтаж фаянсова облицовка и основа по стени в санитарни помещения умивалници и мокри помещения	м2	255,76	4,00	4,00
5	Демонтаж на съществуващи интериорни врати	бр.	46	2,00	5,00
6	Демонтаж на съществуващи външни врати 90/200см	бр.	9	2,00	2,00
7	Демонтаж на дограма	м2	47,02	2,00	1,00
8	Демонтаж на дървен подпрозоречен плот с радиаторни решетки	лин.м	99,2	6,00	2,00
9	Демонтаж на дървена преградна стена 100/250	бр.	8	2,00	1,00
10	Демонтаж на дървени первази по пода	лин.м	224	4,00	5,00
11	Демонтаж и изнасяне на вторични суровини на нафтова система около 2т	бр.	1	4,00	1,00
12	Разбиване на стени	м3	2	4,00	2,00
13	Изнасяне на ръка и натоварване на контейнери за строителни отпадъци и оборудване от мокри помещения	м3	30	2,00	1,00
14	Извозване на строителни отпадъци на депо до 20км.	м3	39	2,00	1,00
	Б: Стени и тавани- облицовки и бояджийски по стени				
15	Доставка и изграждане на стени от газобетон d=25см.	м2	10,56	2,00	3,00
16	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени	м2	255,76	7,00	4,00
17	Доставка и монтаж на фаянс по стени - вкл. лепило, фугираща смес и силикон за уплътнение по ъгли	м2	266,32	1,00	2,00
18	Изчукване и грундиране на стени - подготовка за шпакловка	м2	1693,32	5,00	1,00
19	Вътрешна гипсова шпакловка по стени	м2	1693,32	4,00	2,00
20	Вътрешно обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и врати	лин.м	61,15	1,00	3,00
21	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгловопрофили	лин.м	187,15	2,00	4,00
22	Вътрешна фина шпакловка и шлайфане преди боядисване	м2	1693,32	5,00	5,00
23	Полагане на грунд за стени преди боядисване - вътрешно	м2	1693,32	7,00	2,00
24	Полагане на грунд за тавани преди боядисване- вътрешно	м2	842,65	5,00	8,00
25	Трикратно боядисване на шпакловани стени с цветна водоемулсионна боя (ЛАТЕКС)	м2	1693,32	2,00	2,00
26	Трикратно боядисване на шпакловани тавани с бяла водоемулсионна боя	м2	842,65	1,00	1,00
27	Поставяне на подпрозоречен PVC перваз от вътрешна страна с дълбочина до 15см	м	116,64	2,00	4,00
	Б. Настилки и Замазки				
28	Доставка и полагане на нормалнотонна циментова замазка по подове с дебелина 5см при изкъртени подове	м2	106,39	4,00	2,00
29	Доставка и полагане на хидроизолационна обмазка на циментова основа - под настилки в мокри помещения и кухни	м2	291,9	2,00	4,00
30	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес (мокри помещения и кухни), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	м2	291,9	3,00	3,00
31	Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес (мокри помещения и кухни), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	лин.м	176,61	3,00	6,00
32	Доставка и полагане на самонивелираща замазка 5мм под PVC настилка	м2	138,27	2,00	2,00
33	Доставка и полагане на PVC настилка с фугура по арх. детайл, вкл. лепило	м2	138,27	5,00	2,00
34	Доставка и полагане на PVC перваз тип холкер по детайл, вкл. лепило	лин.м	134,55	3,00	6,00
35	Доставка и полагане на PVC настилка по стъпала, вкл. чело - размер на стъпало 162х32х15см	бр.	23	4,00	7,00
36	Доставка и монтаж на алуминиеви ъглови лайсни по стъпала - дължина на стъпало 162см	бр.	24	3,00	5,00
37	Доставка и полагане на самонивелираща замазка 3мм под паркет	м2	373,6	2,00	4,00
38	Доставка и монтаж на паркет в занималня, вкл. лепило, фугиране, шлайфане и лакиране	м2	373,6	3,00	2,00
39	Доставка и монтаж на дървен перваз H=6см в занималня	лин.м	214,6	2,00	2,00
	В. Покривни работи				
40	Демонтаж - на съществуваща ламарина по бордове и стрехи на кухненски блок и котелно	лин.м	101	5,00	4,00
41	Демонтаж - на съществуващи вълнообразни покривни листове - огради на кухненски блок и котелно	м2	309,84	4,00	4,00
42	Демонтаж - на съществуваща дървена обшивка	м2	309,84	3,00	3,00
43	Ремонт на дървена покривна конструкция - подмяна на изгнили греди, ребра и др. със същите по размер дървени елементи	м3	5,3	5,00	1,00
44	Доставка и монтаж на топлоизолация от мин. вата d=12см мин. 120кг/м3	м2	258,2	5,00	2,00
45	Доставка и монтаж на дървена покривна обшивка с OSB плоскости	м2	300,84	7,00	2,00
46	Доставка и полагане на подкокривна хидроизолация на битумна основа 1пл.	м2	309,84	5,00	3,00
47	Доставка и полагане на летви 3х4см на двойна скара	лин.м	1859,04	4,00	3,00
48	Фугиране на първи ред летви с битумен фугоизолатор	лин.м	1239,36	6,00	3,00
49	Доставка и монтаж на бетонови керемиди	м2	309,84	7,00	2,00
50	Доставка и монтаж на листов материал под било	лин.м	33,96	5,00	1,00
51	Доставка и монтаж на бетонови капаци	лин.м	33,96	2,00	1,00
52	Доставка и полагане на OSB плоскости обшити с поцинкована ламарина по бордове и стрехи и оформяне на чела на стрехи	лин.м	205	4,00	1,00
53	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина ф 100	лин.м	205	5,00	2,00
54	Доставка и обшивка с поцинкована ламарина около комини и др.	м2	30	3,00	1,00
55	Доставка и монтаж на стрехи с поц.ламарина 0,55 мм	м2	205	2,00	1,00
56	Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф 100 за водосточни тръби	лин.м	40	4,00	2,00
57	Доставка и монтаж на барбакан за тераси	бр.	9	3,00	1,00
58	Натоварване и извозване на отпадъци от покрива	м3	15	2,00	2,00
59	Външно фасадно скеле - доставка, монтаж и демонтаж	м2	600	4,00	10,00
	Г. Дограма				
60	Доставка и монтаж на PVC дограма по приложена спецификация - Захранен, бял, с двоен стъклопакет нискоемисионно/бяло стъкло с дебелина 6/4мм.	м2	47,02	2,00	2,00
61	Доставка и монтаж на противопожарна, ал. дограма EI30 по приложена спецификация	м2	5,06	2,00	2,00
62	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати от МДФ	бр.	29	2,00	1,00
63	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати при мокри помещения	бр.	17	2,00	1,00
64	Доставка и монтаж на външни метални врати	бр.	9	2,00	2,00
65	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60 с размери 100/210см	бр.	4	2,00	2,00
66	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 90 с размери 100/210см	бр.	2	2,00	1,00
67	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60 с размери 90/210см	бр.	2	2,00	2,00
68	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 90 с размери 70/210см	бр.	1	2,00	2,00
69	Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати с прекъснат термомост	бр.	14	2,00	4,00
	Д. Фасадни обработки				
70	Доставка и полагане на декоративна мозаечна мазилка цвят и структура по мостра тип мозаечна ПО ЦОКЪЛ, вкл. грунд	м2	172,79	2,00	4,00
71	Доставка и полагане на декоративна силиконова мазилка цвят и структура по мостра тип мозаечна ПО ФАСАДИ, вкл. грунд	м2	570,29	3,00	2,00
72	Доставка и полагане на циментова замазка за наклон по тераси и козирки с дебелина до 5см	м2	45,26	4,00	3,00
73	Доставка и полагане на хидроизолационна обмазка на циментова основа - по козирки и тераси	м2	89,5	5,00	4,00
74	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес по козирки и тераси, вкл. фугиране и уплътняване със силикон	м2	89,5	8,00	2,00
75	Доставка и монтаж на чела от гранитогрес по тераси и козирки, вкл. фугиране и уплътняване със силикон	лин.м	196,8	3,00	3,00
76	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по тераси и площадки H=105см	лин.м	67,6	2,00	4,00
77	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по тераси и площадки H=30см	лин.м	112	1,00	3,00
	Отоплителни инсталации				
1	Водогрейна котел на пелети с отоплителна мощност Qот.=180kW; Nел.=550W; 230V	бр.	1	2,00	2,00
2	Коминно тяло (неръжд./неръжд.) 300/400; L=500mm	бр.	3	3,00	2,00
3	Коминно тяло (неръжд./неръжд.) 300/400; L=1000mm	бр.	2	3,00	2,00
4	Коляно 90° неръжд./неръжд. 300/400	бр.	3	2,00	2,00
5	Универсален ревизионен отвор за почистване неръжд./неръжд. 300/400, L=500	бр.	1	3,00	2,00
6	Мембранен затворен разширителен съд/соларна инсталация/ с обем V=35л	бр.	1	4,00	2,00
7	Мембранен затворен разширителен съд/отоплителна инсталация/ с обем V=150л	бр.	1	5,00	2,00
8	П1-Циркулационна помпа котел /електронна/G=7,8m3/h; H=4,5mH2O; Nел.=0,4W; 230V	бр.	1	2,00	2,00
9	П2-Циркулационна помпа-отопление първи кръг /електронна/G=3,9m3/h; H=7,4mH2O; Nел.=0,5W; 230V	бр.	1	4,00	2,00
10	П3-Циркулационна помпа отопление втори кръг /електронна/ G=3,4m3/h; H=7,2mH2O; Nел.=0,3W; 230V	бр.	1	3,00	2,00
11	П4-Циркулационна помпа отопление секция/електронна/ G=4,3m3/h; H=7,3mH2O; Nел.=0,3W; 230V	бр.	1	4,00	2,00
12	П5-Циркулационна помпа БГВ/електронна/ G=2,2m3/h; H=6,0mH2O; Nел.=0,3W; 230V	бр.	1	3,00	2,00
13	П6-Циркулационна помпа слънчева инсталация /електронна/ G=2,2m3/h; H=6,5mH2O; Nел.=0,3W; 230V	бр.	1	4,00	2,00
14	Водоразпределител/топлоколектор/ с пет извода L=1320mm и диаметър ф200	бр.	1	3,00	2,00
15	Водосъбирател/топлоколектор/ с пет извода L=1320mm и диаметър ф200	бр.	1	2,00	2,00
16	Трипътен вентил със задвижка 11/4"	бр.	1	6,00	2,00
17	Трипътен вентил със задвижка 3"	бр.	1	2,00	22,00
18	Кран сферичен 3" с фланци	бр.	8	2,00	2,00
19	Кран сферичен 21/2" с фланци	бр.	6	2,00	2,00
20	Кран сферичен 11/4"	бр.	6	2,00	2,00
21	Кран сферичен 1"	бр.	8	2,00	2,00
22	Кран сферичен 3/4" с изпразнител	бр.	2	2,00	2,00
23	Радиаторен вентил 1/2"/секретен/	бр.	73	2,00	2,00
24	Радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	73	2,00	2,00
25	Филтър 3"	бр.	2	2,00	2,00
26	Филтър 21/2"	бр.	2	2,00	2,00
27	Филтър 11/4"	бр.	1	2,00	2,00
28	Филтър 1"	бр.	1	2,00	2,00
29	Възвратна клапа 3"	бр.	2	2,00	2,00
30	Възвратна клапа 21/2"	бр.	2	2,00	2,00
31	Възвратна клапа 11/4"	бр.	1	2,00	2,00
32	Възвратна клапа 1"	бр.	1	2,00	2,00
33	Адаптор ф16х1/2"	бр.	292	2,00	2,00
34	Автоматичен обезвъздушител АО1/2"	бр.	44	2,00	2,00
35	Предпазен клапан 1/2" 6Bar	бр.	4	2,00	2,00
36	Манометър	бр.	6	2,00	2,00
37	Термоманометър 6 bar 120°C	бр.	8	2,00	2,00
38	Медна тръба ф23х1	м.л.	80	2,00	3,00
39	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2	м.л.	292	2,00	5,00
40	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe	м.л.	64	2,00	6,00
41	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 32х4,4 PN16	м.л.	218	2,00	5,00
42	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 40х5,5 PN16	м.л.	164	2,00	4,00
43	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 50х6,9 PN16	м.л.	88	3,00	4,00
44	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 63х8,6 PN16	м.л.	66	2,00	5,00

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

45	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 75x10,3 PN16	м.л.	58	4,00	5,00
46	Стабилизирана полипропиленова тръба ППР Stabi-pipe 90x12,3 PN16	м.л.	16	2,00	4,00
47	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф25	м.л.	94	5,00	3,00
48	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф32	м.л.	218	2,00	4,00
49	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф40	м.л.	164	5,00	3,00
50	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф50	м.л.	88	2,00	4,00
51	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф63	м.л.	66	5,00	2,00
52	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф75	м.л.	58	3,00	4,00
53	Топлоизолация с дебелина 13мм за тръба ф90	м.л.	16	2,00	4,00
54	[illegible] с височина H=500;	бр.	1515	2,00	4,00
55	Монтажен кит за радиатор/стойка за закрепване-2бр.; тапа 1/2"; ръчен обезвъздушител 1"; силиконови уплътнения; ключ/	бр.	73	3,00	5,00
56	Пробиване на отвори в бетон до 0,5м2	бр.	50	2,00	4,00
57	Метална конструкция за укрепване	кг.	450	3,00	2,00
	Вентилация				
58	Воден топлообменник "Вода-Въздух" 600x350 2-редов; Δt=20°C; Qот.=50kW;	бр.	1	2,00	2,00
59	Шумоизолирана смукателна вентилационна бокс/агрегат/ за кухня/ V=4000m3/h; H=650Pa; Nел=1,1kW; ~380V, комплект с меки връзки и антивибрационни тампони	бр.	1	2,00	2,00
60	Правоъгълен канален вентилатор VCR-T/B-450; V=4050m3/h;	бр.	1	2,00	2,00
61	Осов вентилатор за прозоречен монтаж с обратна клапа V=520m3/h, H=50Pa, Nел.=41W, 220V	бр.	2	2,00	2,00
62	Мека връзка	бр.	4	2,00	2,00
63	Спирокапал ф160	м.л.	6	2,00	
64	Канален филтър за монтаж на правоъгълен въздуховод 800x500	бр.	1	2,00	2,00
65	НЖР с правоточна клапа 700x500	бр.	1	2,00	2,00
66	НЖР с правоточна клапа 800x500	бр.	1	2,00	2,00
67	Вентилационна решетка за стъргала 425x125 с регулираща и направляващи [illegible]	бр.	2	2,00	2,00
68	Таванна вентилационна решетка APKW 4-595 с регулираща и направляваща [illegible]	бр.	8	2,00	2,00
69	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,6мм, правоъгълен прав с периметър до 2700мм	м2	44	2,00	2,00
70	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,6мм, правоъгълен фасонен с периметър до 2700мм	м2	16	2,00	2,00
71	Самозалепваща топлоизолация от микропореста гума и алуминиево фолио с дебелина 9мм	м2	22	2,00	2,00
72	Крайстенен кухненски смукател/подвесен/ [illegible] неръждаема стомана [illegible]/ 1000x800x450; V=800m3/h; комплект с регулираща клапа, плетени филтри-3бр. и [illegible]	бр.	1	2,00	2,00
73	Изолация от минерална вата/[illegible] с алуминиево фолио с клас на горимост A1/	м2	18	2,00	2,00
74	Табло КИПиА за управление на вентилационни системи	бр.	1	2,00	2,00
75	Противопожарна клапа 600x300 със стопяема [illegible]	бр.	1	2,00	2,00
76	Регулираща клапа ф160	бр.	1	2,00	2,00
77	Регулираща клапа 300x200	бр.	2	2,00	2,00
78	Метална конструкция за укрепване	кг.	90	2,00	2,00
	Демонтаж на [illegible] и съоръжения				
79	Демонтаж на съществуваща инсталация	бр.	1	4,00	1,00
80	Демонтаж на метална конструкция	к-т	1	4,00	1,00
2	ЧАСТ "ВиК - ВЪТРЕШНИ МРЕЖИ"				
I.	Демонтаж				
1	Демонтаж на поцинковани тръби до ф2"	м	398	4,00	2,00
2	Демонтаж на спирателни кранове ф1/2" до ф1 1/2"	бр.	60	2,00	2,00
3	Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари	бр.	10	3,00	2,00
4	Пробиване на отвори за инсталации в бетон с р-ри до 15/15	бр.	21	4,00	2,00
5	Пробиване на отвори за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15	бр.	22	3,00	2,00
6	Направа на улеи за инсталации с р-ри до 15/15 в тухлен зид	м	154	2,00	2,00
7	Направа на улеи за инсталации в бетонови стени или плочи с размери до 15/15	м	40	2,00	2,00
8	Демонтаж PVC тръби ф50	м	100	3,00	2,00
9	Демонтаж PVC тръби ф110	м	38	4,00	2,00
10	Демонтаж на клозетно седало и клоз.казанче	бр.	10	3,00	2,00
11	Демонтаж кухненски мивки	бр.	18	2,00	2,00
12	Демонтаж тоалетни умивалници	бр.	14	4,00	2,00
13	Демонтаж смесителни батерии	бр.	36	3,00	2,00
14	Демонтаж ПС ф 50	бр.	28	2,00	2,00
15	Направа на връзка на нови ВиК със съществуващи мрежи	бр.	8	4,00	2,00
II.	Сградни водопроводи				
1	Полипропиленови тръби ф20 PN 20	м	5	3,00	2,00
2	Полипропиленови тръби ф25 PN 20	м	55	3,00	2,00
3	Полипропиленови тръби ф32 PN 20	м	27	3,00	2,00
4	Полипропиленови тръби ф40 PN 20	м	16	4,00	2,00
5	Полипропиленови тръби ф50 PN 20	м	15	3,00	2,00
6	Полипропиленови тръби ф20 PN 10	м	56	2,00	2,00
7	Полипропиленови тръби ф20 PN 20 с алуминиева вложка	м	65	2,00	2,00
8	Полипропиленови тръби ф25 PN 20 с алуминиева вложка	м	97	3,00	2,00
9	Полипропиленови тръби ф32 PN 20 с алуминиева вложка	м	34	3,00	2,00
10	Полипропиленови тръби ф40 PN 20 с алуминиева вложка	м	28	3,00	2,00
11	Укрепване полипропиленови тръби със скоби ф20	бр.	126	5,00	2,00
12	Укрепване полипропиленови тръби със скоби ф25	бр.	152	5,00	2,00
13	Укрепване полипропиленови тръби ф32	бр.	61	5,00	2,00
14	Укрепване полипропиленови тръби ф40	бр.	44	5,00	2,00
15	Укрепване полипропиленови тръби ф50	бр.	15	5,00	2,00
16	Топлоизолация "Мирелон" за полипропиленови тръби ф20	м	22	3,00	2,00
17	Топлоизолация "Мирелон" за полипропиленови тръби ф25	м	152	3,00	2,00
18	Топлоизолация "Мирелон" за полипропиленови тръби ф32	м	61	3,00	2,00
19	Топлоизолация "Мирелон" за полипропиленови тръби ф40	м	44	3,00	2,00
20	Топлоизолация "Мирелон" за полипропиленови тръби ф50	м	15	3,00	2,00
21	Смесителни батерии за тоалетни мивки - стенни,обикновени	бр.	14	3,00	2,00
22	Смесителни батерии за кухненски мивки	бр.	18	3,00	2,00
23	Смесителни душ-батерии - обикновени	бр.	4	3,00	2,00
24	Устройство за тоалетно казанче	бр.	18	3,00	2,00
25	СК ф20 /спирателен кран/	бр.	15	3,00	2,00
26	СК ф25	бр.	35	3,00	2,00
27	СК ф32	бр.	1	4,00	2,00
28	СК ф50	бр.	2	3,00	2,00
29	ОК ф32 /обратна клапа/	бр.	3	4,00	2,00
30	ОК ф40	бр.	4	3,00	2,00
31	СК ф20 с изпразнител	бр.	1	4,00	2,00
32	СК ф25 с изпразнител	бр.	5	3,00	2,00
33	СК ф32 с изпразнител	бр.	5	3,00	2,00
34	СК ф40 с изпразнител	бр.	3	3,00	2,00
35	СК ф50 с изпразнител	бр.	1	3,00	2,00
36	Мини спирателни кран	бр.	32	3,00	2,00
37	Доставка и монтаж на бойлер-по ОВ проект	бр.	2	3,00	2,00
38	Доставка и монтаж на ел. помпа за циркулационна вода Ø1" за Q= 162 л/ч; H=5м тип UPS25-60, N=150 вата	бр.	1	3,00	4,00
39	Компенсатори тип гривна ø25	бр.	2	3,00	3,00
40	Компенсатори тип гривна ø32	бр.	1	3,00	2,00
41	Компенсатори тип гривна ø40	бр.	1	3,00	4,00
42	Доставка и монтаж на механичен термостатичен 1/2"	бр.	6	3,00	2,00
43	Замонолитване на отвори за инсталации в ст.бет. плоча с размери до 20/20	бр.	5	3,00	3,00
44	Замонолитване на отвори за инсталации в тухлен зид с размери до 20/20	бр.	31	3,00	2,00
45	Замонолитване на улеи за инсталации в тухлен зид с размери до 15/15	м	104	3,00	4,00
46	Дезинфекция на водопровод	м	342	3,00	3,00
47	Изпитване на водопровод	м	342	3,00	4,00
III.	Канализация				
1	PVC тръби ф 50	м	121	3,00	4,00
2	PVC тръби ф 110	м	38	3,00	3,00
3	PVC тръби ф 160	м	0	3,00	2,00
4	PVC тръби ф 110 дебелостенни	м	24	3,00	4,00
5	PVC тръби ф 160 дебелостенни	м	35	3,00	2,00
6	ПС ф 50	бр.	23	3,00	3,00
7	ПС ф 100	бр.	5	3,00	2,00
8	Стоманена тръба ф 100	м	10	3,00	4,00
9	Стоманена тръба ф 50	м	14	3,00	3,00
10	РО ф110	бр.	7	3,00	4,00
11	РО ф50	бр.	15	3,00	2,00
12	Вентилационна шапка ф50	бр.	4	4,00	2,00
13	Вентилационна шапка ф110	бр.	5	3,00	2,00
14	Доставка и монтаж на мазниноуловител Eco-Mobil-PE	бр.	7	4,00	2,00
15	Клозетно седало с горно оттичане и ниско клоз.казанче - моноблок - обикновени, детски	бр.	10	3,00	2,00
16	Тоалетни умивалници - детски	бр.	14	4,00	2,00
17	Кухненска мивка-по технологичен проект	бр.	18	3,00	2,00
18	Замонолитване на улеи за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15	м	20	3,00	2,00
19	Замонолитване на отвори за инсталации в тухлен зид 1 тухла размери до 20/20	бр.	10	3,00	2,00
20	Замонолитване на отвори за инсталации в ст.бет. плоча с размери до 20/20	бр.	7	3,00	2,00
21	Замонолитване на улеи за инсталации в ст.бет. плоча с размери до 20/20	м	20	3,00	2,00
22	Изпитване на канализация	м	59	3,00	2,00
23	Разваляне и възстановяване на бетонова настилка	м²	47	3,00	4,00
24	Направа на изкоп в земни почви с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м, неукрепен	м³	38	3,00	3,00
25	Направа на пясъчна подложка под тръби вкл. доставка и транспорт	м³	7	3,00	2,00
26	Направа на обратен насип с пясък над теме тръба, вкл. доставка и транспорт	м³	31	3,00	4,00
27	Извозване на земни маси и отпадъци на депо	м³	40	3,00	2,00
28	Трамбоване на земни маси на пластове от 0,25м до плътност 1,7 т/м³	м³	58	3,00	3,00
I.	[illegible]				
1	Доставка и монтаж на нов табло РТн - съгласно еднолинейна схема, за открит монтаж, метално, окомплектовано с всички необходими аксесоари, IP31	бр.	1	5,00	4,00
2	Реконструкция в ГРТ съгласно еднолинейна схема (монтаж на два нови автоматични прекъсвача и свързване на 2 кабела СВТ 5x16 и СВТ 3x4)	бр.	1	3,00	2,00
3	Доставка и монтаж на табло за подгряване на [illegible], комплектовка доставка със съоръжението по проект на фирмата доставчик	бр.	1	3,00	3,00
II.	Кабели, защитни тръби				
4	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 5x16 от ГРТ до РТн в тръба ф32 вкл. тръба ф32	м.	65	3,00	2,00
5	Доставка и изтегляне на кабел тип ПВА1 3x4 магистрали и бойлери	м.	280	3,00	2,00
6	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM3x2,5, отклонения към контакти и до табло за платформи	м.	66	3,00	2,00
7	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM 3x1,5	м.	210	3,00	2,00
8	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM 5x4 - до табло подгряване рампа	м.	30	3,00	2,00
9	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø29	м.	10	3,00	4,00
10	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø23	м.	280	3,00	3,00
11	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø16	м.	66	3,00	2,00
12	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø13 за осветление	м.	210	3,00	4,00
III.	Осветителни инсталации				
13	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафон, с енергоспестяваща лампа 23W, IP44	бр.	15	3,00	3,00
IV.	[illegible]				

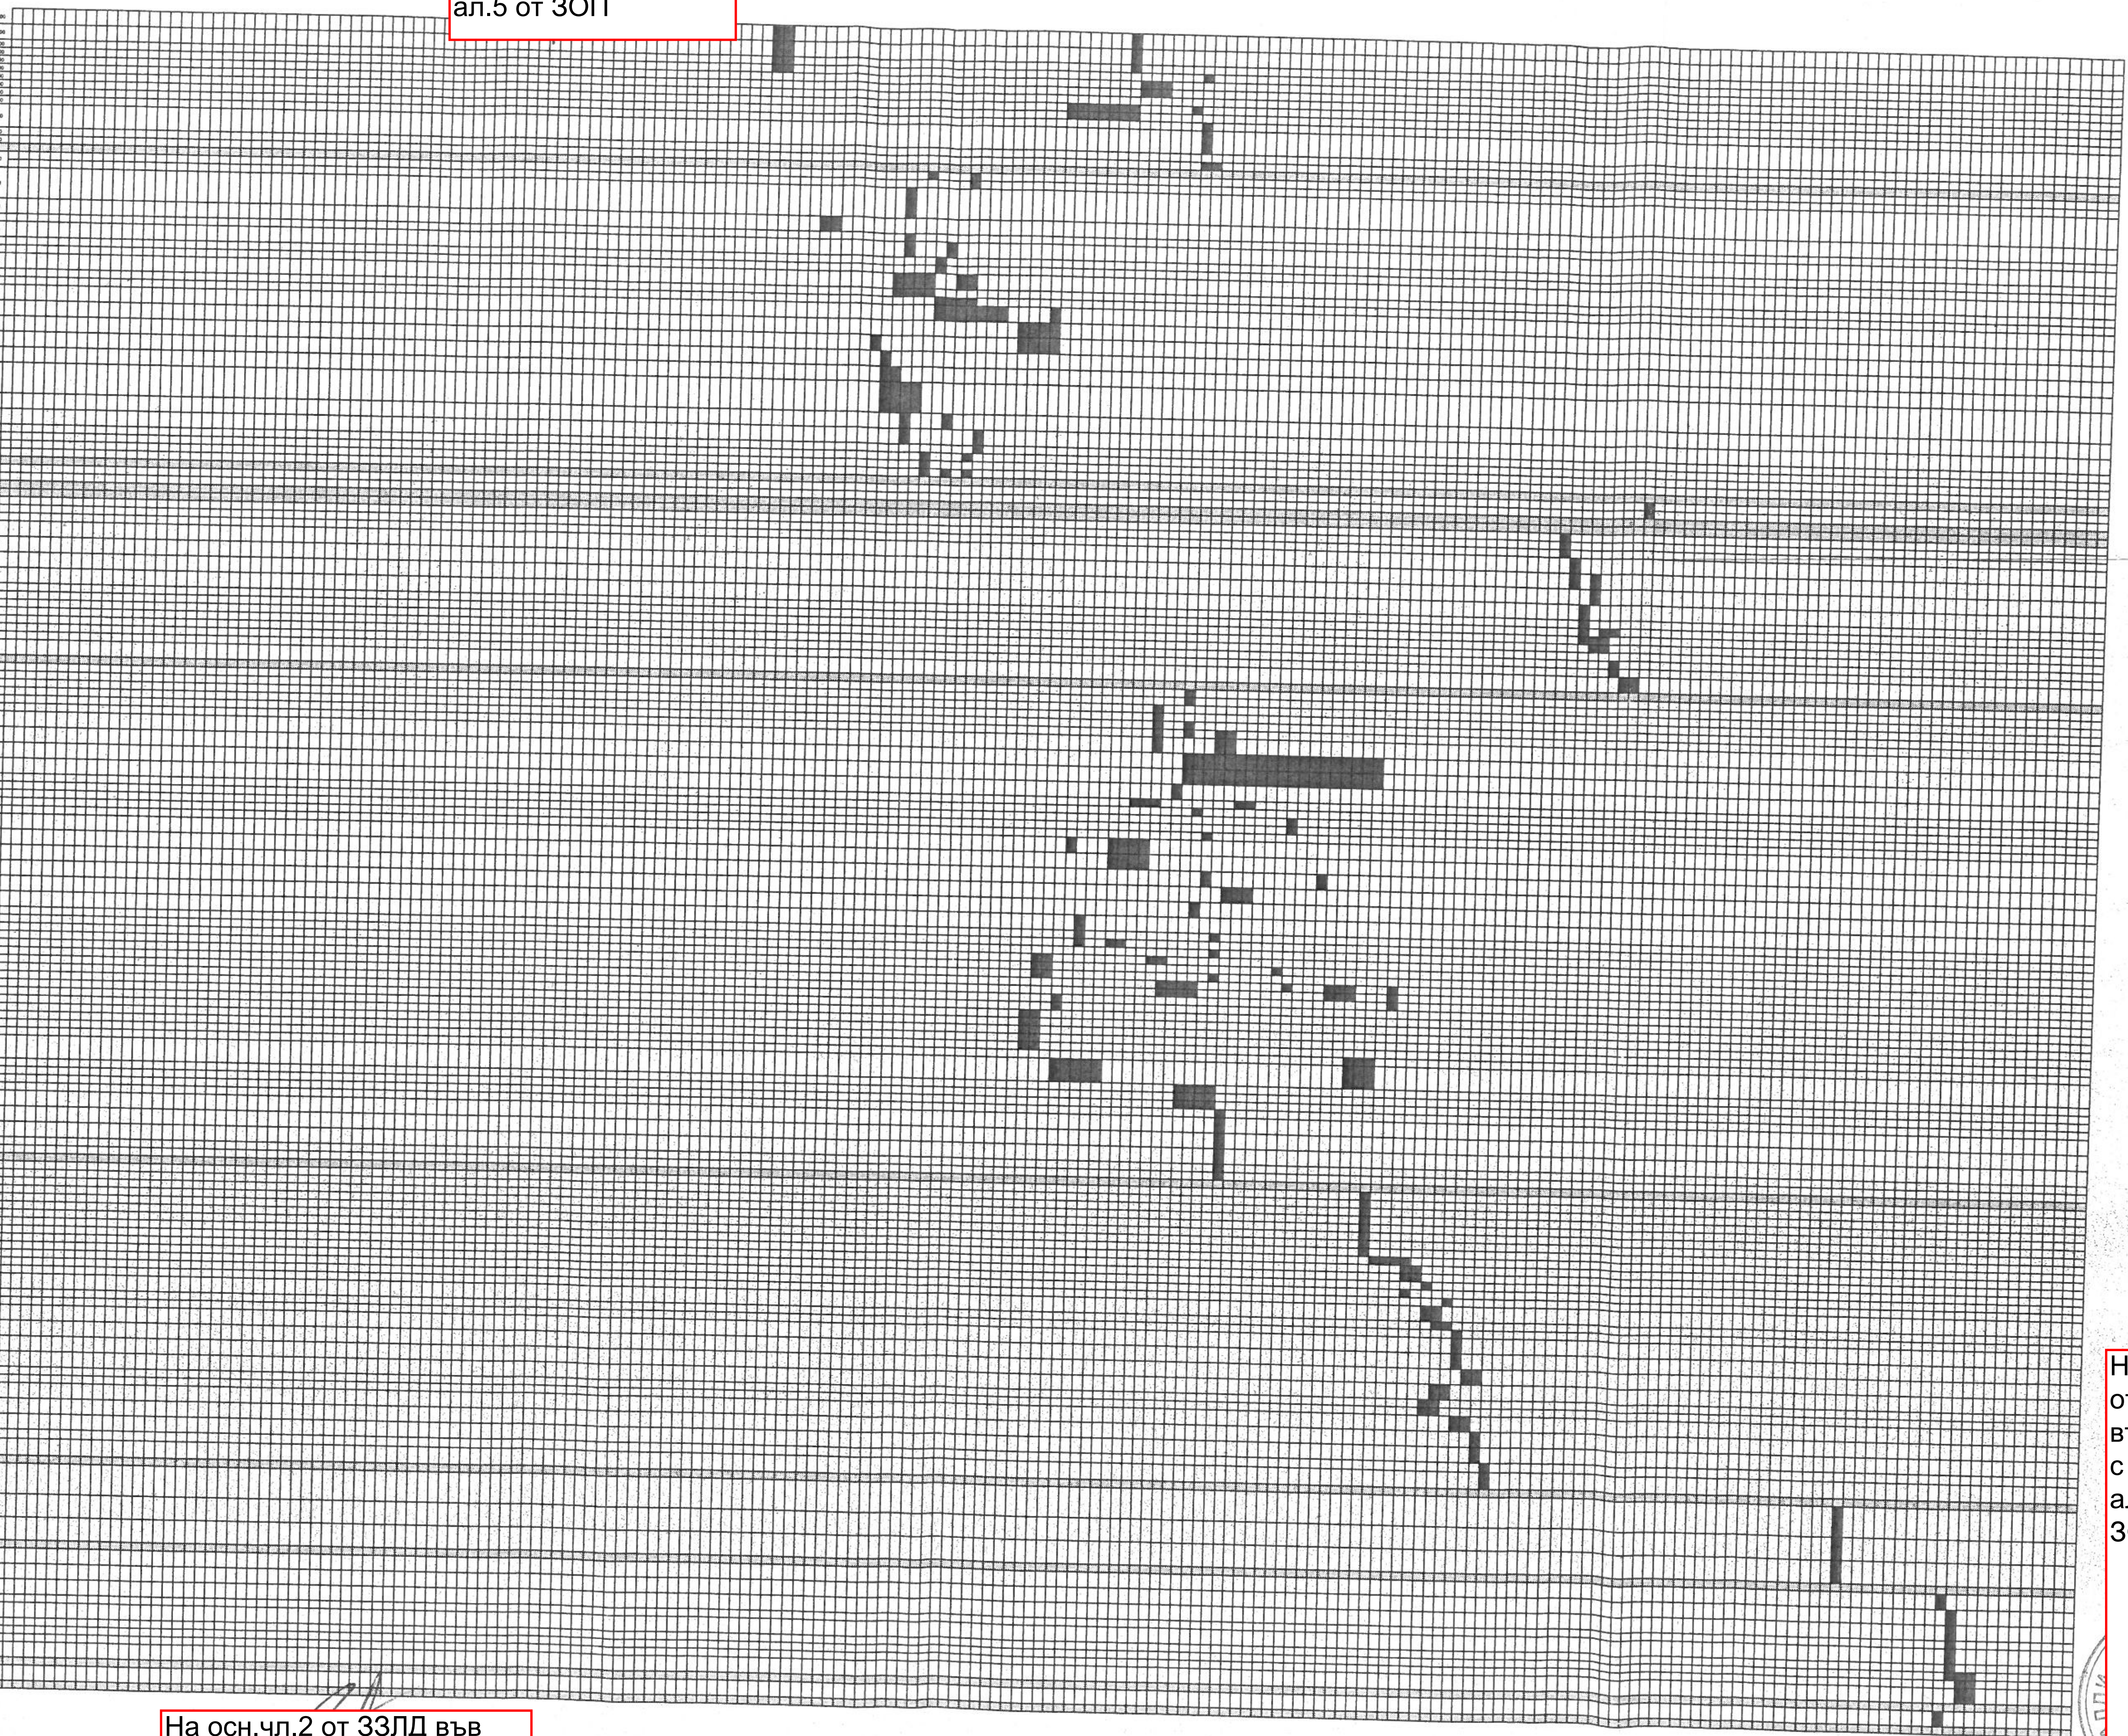

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

14	Доставка и монтаж на контакт за монтаж за релси, 16А/230V, за дворетно монтиране на стена, скрито монтиращ, IP44	бр.	4	3,00	3,00
15	Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, IP44,монтиращ с винт за монтиране	бр.	1	3,00	3,00
16	Доставка и монтаж на датчик за регулиране "ТРЕ" с повторение 360° с подвижен за движение и осветяване,свързващи с всички необходими аксесоари,IP44	бр.	13	3,00	2,00
17	Доставка и монтаж на бойлерно тяло IP44	бр.	1	3,00	3,00
X.	Инсталационни работи в канали				
19	Доставка и монтаж на инсталационни кутии	бр.	10	3,00	4,00
19	Доставка и монтаж на тръгни отвадване	бр.	1	3,00	3,00
	А.Конструктивно по видове фундаментни системи				
	Доставки				
1	Доставка на съществуваща топлофикационна мал. стойностна бордюри	м3	518,24	3,00	4,00
2	Доставка на съществуващи детски съоръжения, вкл. доставка на бетонов фундамент	бр.	25	3,00	2,00
3	Доставка на съществуваща пейка - нова модел	брой	187,8	3,00	3,00
4	Изкопаване на съществуващи детски съоръжения и складиране на място	бр.	1	3,00	2,00
5	Изкоп в земна почва	м3	601,38	3,00	3,00
6	Изкопаване на земна почва на ръка, вкл. такса депо, до 1бм	м3	842,21	3,00	2,00
7	Изкопаване на стара тротоарна настилка, механизирано	мм	0,2	3,00	2,00
8	Изкопаване на стара тротоарна настилка на ръка, вкл. такса депо, до 12км	м3	43,93	3,00	2,00
9	Товарно-разтоварни операции до 6-ой	м3	341,42	3,00	4,00
10	Доставка на товарно-разтоварни операции до 6-ой, от 12км	м3	341,42	3,00	3,00
11	Обратен	м3	150	3,00	2,00
12	Доставка на пясък от 12км	м3	150	3,00	4,00
13	Подреждане на технологичната пясъчна настилка	мм	18	3,00	2,00
14	Доставка и ПУ ивици за тротоарна плочка	мм	12	3,00	3,00
15	Доставка на инвентарен дефектен протокол	м3	30,47	3,00	2,00
16	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с цвят лавандов сиво с размери по приобщаване мостри от предложен материал подложени на гръд фото	м2	518,24	3,00	4,00
17	Доставка и монтаж на тревешки бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/60/8см върху пластмасова дренажна решетка	лин.м	334,5	3,00	2,00
18	Доставка и монтаж на уличен бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/20/8см или еквивалентно върху пясъчна дренажна решетка	лин.м	220	3,00	3,00
19	Доставка и монтаж на тротоарни бетонови плочи с размери 50/50/8см или еквивалентно върху на стена фото	м2	3,88	3,00	2,00
20	Доставка монтаж на ивична настилка с цветна от тротоарен гранит при дренажно бордюрник фото	м2	84,2	3,00	2,00
21	Доставка и монтаж на стълби с ниво от тротоарен гранит при ниво стъпки от отворено 2см до 5см	лин.м	30,6	3,00	2,00
22	Доставка и монтаж на стълби с ниво от тротоарен гранит при ниво стъпки при отворено 2см до 5см	лин.м	23,8	3,00	2,00
23	Доставка и монтаж на парапет по бордюри от полирен гранит при ниво стъпки и ниво. 10см до 25см	лин.м	43,7	3,00	2,00
24	Доставка и монтаж на бетонови вазони по СЕРАДА с декоративен ефект	лин.м	46,7	3,00	4,00
25	Доставка и полагане до декоративна минерална мазилка цвета и гарнитурите по мостри вид-каменна ЗВО ЦЕНЕЗЪЛ СЕРАДА, вкл. грунд	м2	343,9	3,00	3,00
26	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ ПЛАЖА ЗА СЕРАДА по проект	бр	112	3,00	2,00
27	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ ПЛАЖА ЗА СЕРАДА по проект	бр	1	3,00	4,00
28	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ КОШОВЕ ЗА СЕРАДА по проект	бр	113	3,00	2,00
29	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	3,00
30	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	2,00
31	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	4,00
32	Доставка и полагане на хидроизолация, вертикална настилка	м2	484,05	3,00	2,00
33	Доставка и полагане на обстоятелствена мрежа от агрофиба	м2	38	3,00	3,00
34	Фундаменти на съществуваща дефектна настилка	м2	347,72	3,00	3,00
35	Изравнение на неравностите	м2	30,19	3,00	3,00
36	Общо бетонова основа	м2	347,72	3,00	3,00
37	Фиброармировъчна мрежа	т	44,13	3,00	3,00
38	Ръчно бетонова основа	м2	347,72	3,00	3,00
39	Доставка и полагане на пясъчно дефектобетонно бло-	м2	347,72	3,00	5,00
40	Доставка и монтаж на подложки и изолация за нови и съществуващи шахтовете на подземните комуни	бр.	1	3,00	3,00
41	Доставка и монтаж на метални капаци с ниво на стъпка при ниво. 10см до 25см	бр.	1	3,00	4,00
42	Доставка и монтаж на метални капаци с ниво на стъпка при ниво. 10см до 25см	бр.	1	3,00	2,00
43	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	3,00
44	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	4,00
45	Доставка и полагане на хидроизолация, вертикална настилка	м2	484,05	3,00	2,00
46	Доставка и полагане на обстоятелствена мрежа от агрофиба	м2	38	3,00	3,00
47	Фундаменти на съществуваща дефектна настилка	м2	347,72	3,00	3,00
48	Изравнение на неравностите	м2	30,19	3,00	3,00
49	Общо бетонова основа	м2	347,72	3,00	3,00
50	Фиброармировъчна мрежа	т	44,13	3,00	3,00
51	Ръчно бетонова основа	м2	347,72	3,00	3,00
52	Доставка и полагане на пясъчно дефектобетонно бло-	м2	347,72	3,00	5,00
53	Доставка и монтаж на подложки и изолация за нови и съществуващи шахтовете на подземните комуни	бр.	1	3,00	3,00
54	Доставка и монтаж на метални капаци с ниво на стъпка при ниво. 10см до 25см	бр.	1	3,00	4,00
55	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	2,00
56	Доставка и монтаж на метални решетки врати по проект	бр.	1	3,00	3,00
	Б. Конструктивни работи по нови Конструкции				
1	Доставка и полагане на подложен бетон	м3	5,76	3,00	3,00
2	Доставка и полагане на Армо Б30 на основи	м3	20,5	3,00	2,00
3	Доставка и полагане на Армо Б30 под хидроизолация настилки	м3	30,3	3,00	4,00
4	Доставка, монтаж и демонтаж на опажи - основи	м2	41,7	3,00	2,00
5	Доставка, монтаж и демонтаж на опажи - под хидроизолация настилки	м2	142	3,00	3,00
6	Доставка и полагане на армировка - основи	кг	966	3,00	3,00
7	Доставка и полагане на армировка под хидроизолация настилки	кг.	41972,2	3,00	3,00
	ВАЖНО: ЦЕНИ ДЕЛОМЕЙДЖИЙСКИ ПОДПОРИ				
1	Разкопаване и изстругване на асфалтова настилка	м2	2	3,00	3,00
2	Разкопаване и изстругване на тротоарна настилка	м2	1	3,00	2,00
3	Разкопаване и изстругване на бордюр	м	2	3,00	4,00
4	Изкопи на земни с земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м механизирано	м3	83	3,00	3,00
5	Изкопи на земна почва съдържаща под трубе вкл. доставка и транспорт	м3	9	3,00	3,00
6	Изкопи на обратен изкоп с почва под тоне трубе, вкл. доставка и транспорт	м3	28	3,00	4,00
7	Насипване на земен изкоп с отстраняе на дебо	м3	37	3,00	2,00
8	Заглаждане на изкоп със земен изкоп	м2	48	3,00	3,00
9	Трамбоване на земен изкоп на пластове от 0,25м до дебелина 1,5 м	м3	48	3,00	3,00
10	Доставка и монтаж и ремонт на ПЕВП тръби ø50 PN10	м	78	3,00	2,00
11	Доставка и полагане на изчаквателен дренаж	м	78	3,00	4,00
12	Доставка и полагане на дренажна дюшка	м	78	3,00	3,00
13	Доставка и монтаж на ТСХ-20/1/2"	бр.	1	3,00	3,00
14	Пресяване на водоносния дренаж	бр.	1	3,00	3,00
15	Доставка и монтаж на водомер 4/50 ДВМ, Qmax=20м^3/ч с окомплектоване с дистанционно отчитане на разходи	бр.	1	3,00	2,00
16	СК ø50	бр.	1	3,00	4,00
17	СК ø50	бр.	1	3,00	3,00
18	СК ø50 с шибърчето	бр.	1	3,00	3,00
19	Филтър ø50	бр.	1	3,00	3,00

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
